

Inspectierapport n° 7

Datum inspectie: 05-09-2022

Datum rapport: 09-09-2022

Calamiteit: Brand

Bedrijfspannd,
op het volgende adres:
Trakelweg 72, 8800 Roeselare.



Aanwezigen/contactpersonen

partij	contact	Aanw.	partij	contact	Aanw.
Stad Roeselare	Burgemeester dhr. Kris Declercq.	✗	SGI Compliance	dhr. Peter Nagels	✓
	Algemeen directeur dhr. Geert Sintobin	✗		dhr. Jérôme Moureau	✗
	Communicatie dhr. Delphan Deroo	✗			
	Handhavings-ambtenaar dhr. Thomas Verschuere	✗			
		✗			

Inleiding

Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van een door SGI Compliance uitgevoerde inspectie in opdracht van **Stad Roeselare**.

Inspectie week 3 na de brand
1 week na afronding sanering openbaar domein

Opgesteld naar eer en geweten door deskundige
namens SGI Compliance

dhr. Peter Nagels

Deskundige

opgemaakt te Aartselaar, 9-9-2022

Projectgegevens :

Dossiernummer : D-5937 (Stad Roeselare)

Projectnummer : 122841801

Datum : 15-08-2022

Onderzocht door:

dhr. Peter Nagels

SGI Compliance

Vluchtenburgstraat 13

2630 Aartselaar

Belgium

www.sgicompliance.be

1 Resultaten

1.1 Staalname brokstukken vezelcementen dakbedekking

- Er werden in deze fase geen bijkomende monsters genomen

1.2 Staalname (kleefstalen) op kritieke plaatsen

- Er werden in deze fase geen bijkomende monsters genomen

1.3 Controle bij start van saneringswerken ter beperking van vezelverspreiding

Controle op aanwezigheid van middelen (zoals beschreven in werkplan) bij de start van de werken.

a) Genomen veiligheidsmaatregelen bij toegang tot site:

- Afbakenen van de toegang tot perceel brandhaard bij start van de saneringswerken (poort aan loodsen werd afgesloten, waarschuwingsbord en lint aanwezig)



•

b) Genomen veiligheidsmaatregelen voor eigen werknemers :

- Voorzien van douche-unit
- PBM's (gebruik van volgelaatsmasker tijdens de werken)



c) Genomen veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van vezelverspreiding:

- Fixatie voor en tijdens verwijdering van (resten) golfplaten op de daken



Aandachtspunt (bijkomende advies gegeven ter plaatse) : verneveling in omgeving om stofopwaaiing te voorkomen.

d) Controle op mogelijke vezelverspreiding tijdens de werken:

- Luchtmetingen werden geplaatst door erkend labo :
 - Persoonlijke meting op een van de werknemers
 - Omgeving van de saneringslocatie
 - Omgeving van de afvalcontainer
 - Omgeving op de site (verder weg van de saneringslocatie)
 - In douche-unit



Het plaatsbezoek werd uitgevoerd op de eerste dag van de werken. Alle maatregelen zoals beschreven waren genomen, alle materialen waren aanwezig om een goede start te maken.

Bijkomende verneveling is voorzien, echter nog niet opgestart. Dit hebben we bij ons bezoek wel geadviseerd om de vezelconcentratie onder controle te houden tijdens de uitvoering van de werken.

Een verdere opvolging van de werken zal het verdere verloop kunnen beoordelen. Dit kan door de eigen diensten worden uitgevoerd.

Belangrijkste aandachtspunten om het voorkomen van een mogelijke verspreiding te beoordelen zijn :

- De verneveling en fixatie tijdens de werken
- De aanwezigheid van het labo
- De resultaten van de dagelijkse luchtmetingen (resultaten < 0,010 vezels/cm³).

1.4 Visuele inspectie ter bepaling van de verspreiding door weersomstandigheden

Aangezien de kans bestaat dat flinters in bomen zijn terechtgekomen en deze bij gevolg opnieuw kunnen worden verspreid door toedoen van veranderende weersomstandigheden (wind) werd een bijkomende inspectie gedaan van het openbaar domein.

Op enkele plaatsen werden nog sporadisch flinters waargenomen. De hoeveelheid was zeer beperkt er werd op het moment van inspectie verwijderd.

Kruispunt Guidogezellelaan en Zonnebloemlaan :

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Deken de Saegerplein (plantenperkje):

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Jan Breydelstraat (goot rijweg) :

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.



Gudrunplein (grasperk) :

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd.

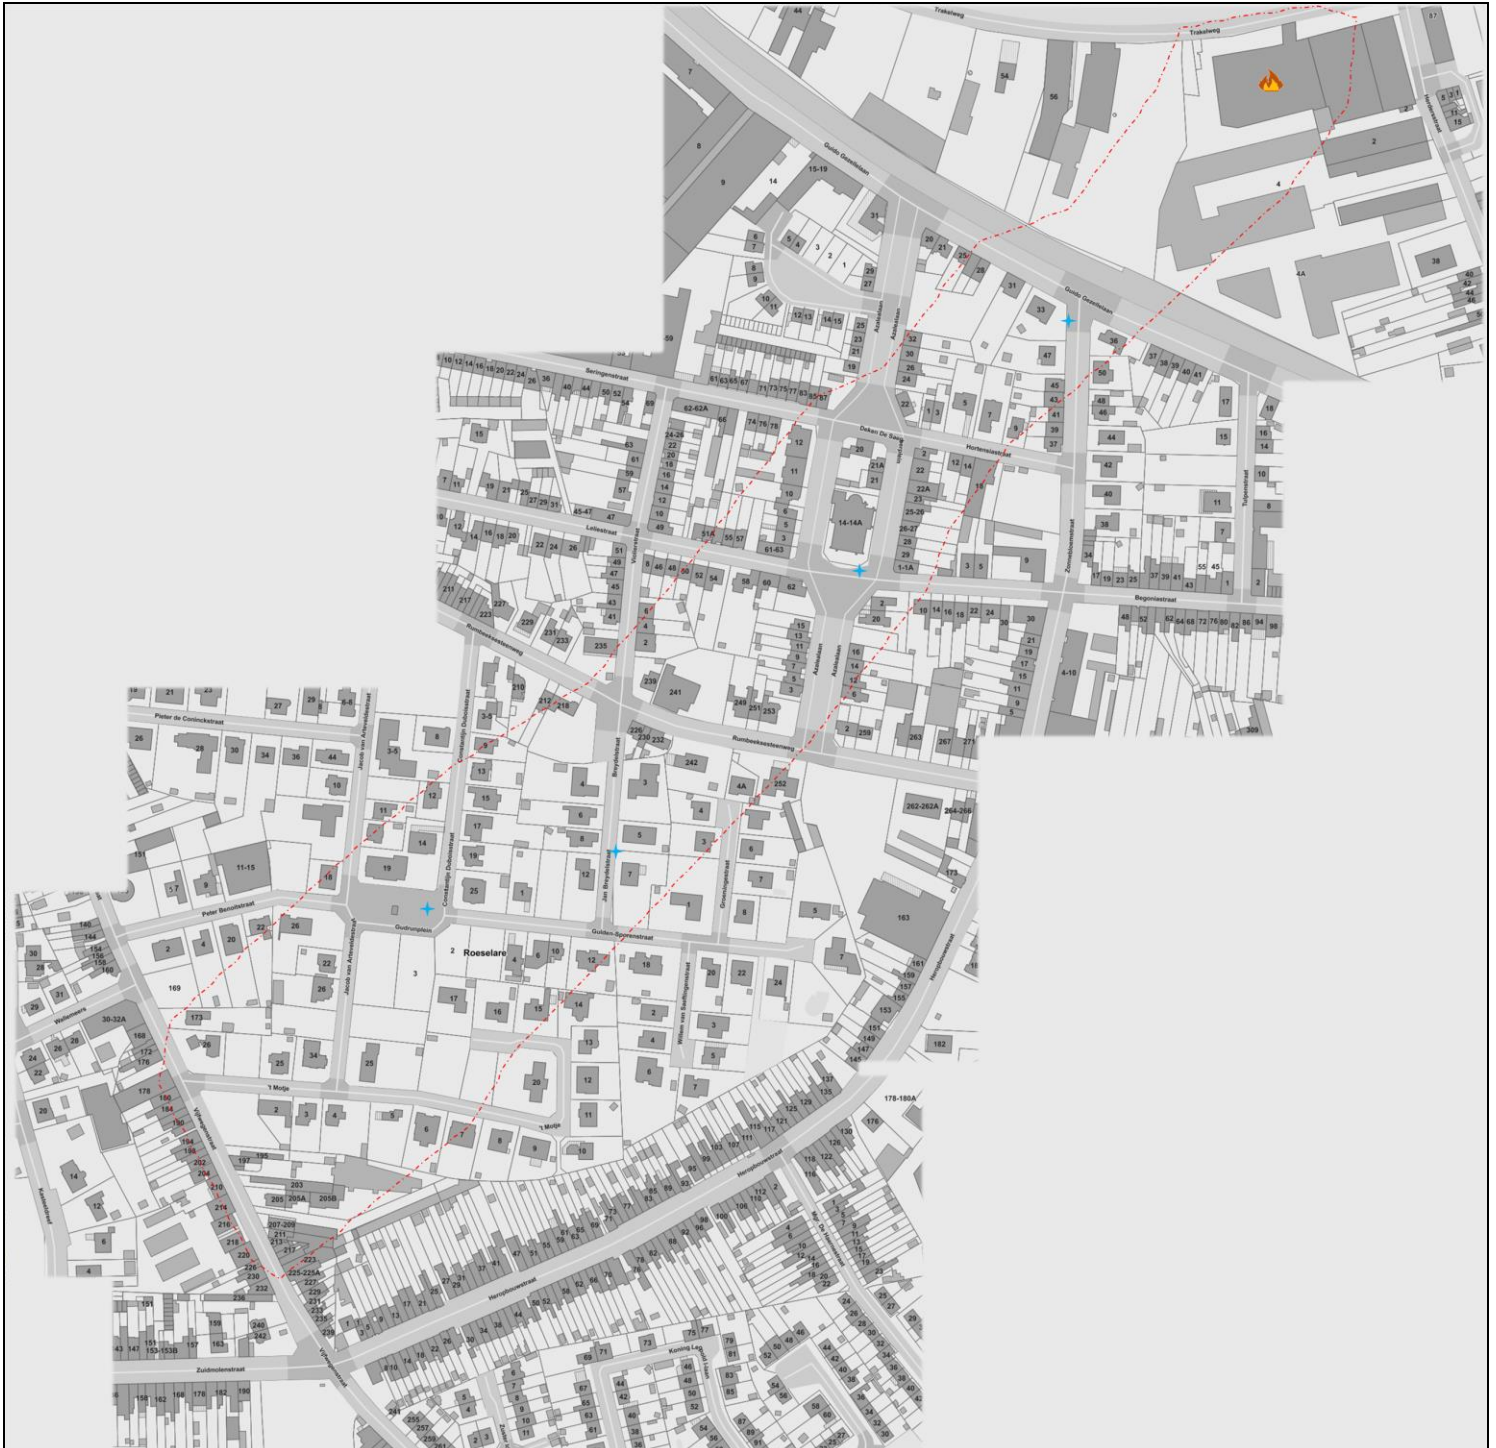


Het plan met weergave van de waarnemingen is opgenomen in bijlage 1.



Conclusie : een bijkomende reiniging van het openbaar domein is niet noodzakelijk.

Bijlage 1 : Plannen

Bijlage 1a : Inspectie openbare weg



Waarbij :

	Plaats waar 1 enkel stukje werd opgemerkt en meteen werd verwijderd.
	Onderzochte perimeter
